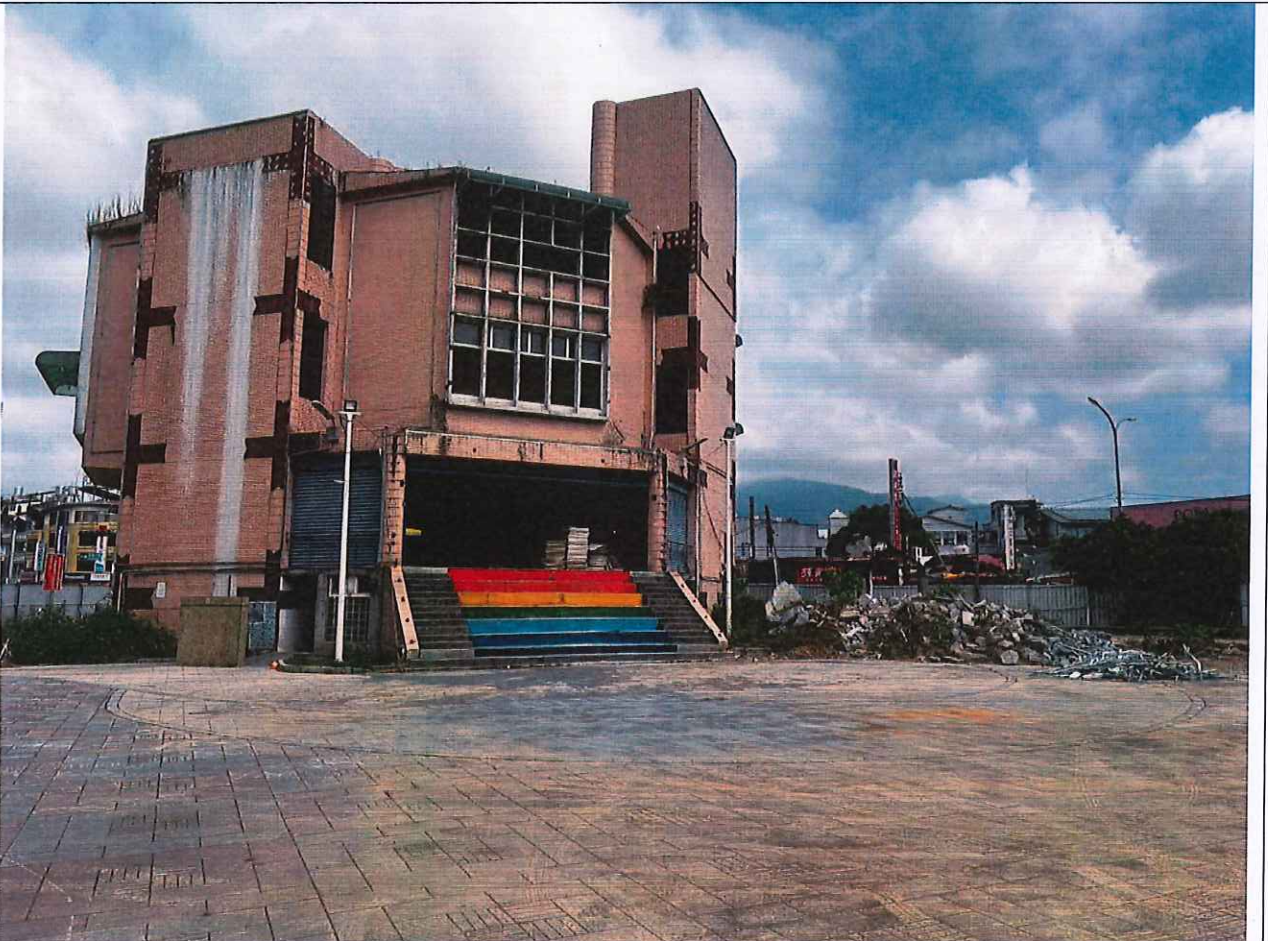


埔里鎮公所主辦機關工程督導紀錄表(第 1 次)

工 程 名 稱	埔里鎮仁愛公園老人會館拆除暨多功能社會福利館新建工程			
主 辦 機 關 (課 室)	埔里鎮公所工務課	監造單位	大量建築師事務所	
承 攬 廠 商	榮家建設有限公司	相關廠商		
督 導 人 員	吳秉毅	督導日期	114. 年 10 月 22 日	
工 程 執 行 進 度	預定進度	0.8 %	實際進度	1.2 %
施工項目及 工程進度之概述	假設工程：圍籬已完成施作、工務所搭建完成。 拆除工程：鎮安宮水塔遷移完成、建築物設備拆除中。			
督導重點項目	一、 承商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、監造日誌、缺失改善等) 督導情形：			
	二、 承商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形：			
	三、 安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 告示牌及圍籬施作完成！			
	四、 結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形：			
	五、 其他(如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形：			
對承商指示事項	指示項目： 拆除作業時請加強周邊安全，並應撒水 避免揚塵影響周遭環境。 缺失改善日期：限定 年 月 日提報	承 商 簽 認	莊冠文 6912072576	
對監造單位指示事項	指示項目： 請確實督導！ 缺失改善日期：限定 年 月 日提報	監 造 簽 認	陳廣誌 莊冠文	
主辦機關核章	吳秉毅 黃木良 10/22 技士吳秉毅 10/22 埔里鎮公所 康雅淳 主任秘書 埔里鎮 廖志城(甲) 鎮長 114.10.23 工務課 黃木良 課長 10/23			

附件一

說明	1. 基地位置
	
說明	2. 舊會館內部清理
	

附件一

3. 工程告示牌

說明



說明
