

埔里鎮公所主辦機關工程督導紀錄表(第 7 次)

工 程 名 稱	埔里鎮仁愛公園老人會館拆除暨多功能社會福利館新建工程			
主 辦 機 關 (課 室)	埔里鎮公所工務課	監造單位	大量建築師事務所	
承 攬 廠 商	榮家建設有限公司	相關廠商		
承 辦 人	吳秉叡	督導日期	115 年 1 月 28 日	
工 程 執 行 進 度	預定進度	12.5 %	實際進度	16.8 %
施工項目及工程進度之概述	1F頂板組模 鋼筋綁紮			
督導重點項目	模板平整、整潔 環境整潔 工區內安全措施			
對承商指示事項	指示項目： 無。	承 商 認 簽		
	缺失改善日期：限定 年 月 日提報			
對監造單位指示事項	指示項目： 無。	監 造 認 簽		
	缺失改善日期：限定 年 月 日提報			
督導人員簽名				

承辦人員

技士吳秉叡

單位主管

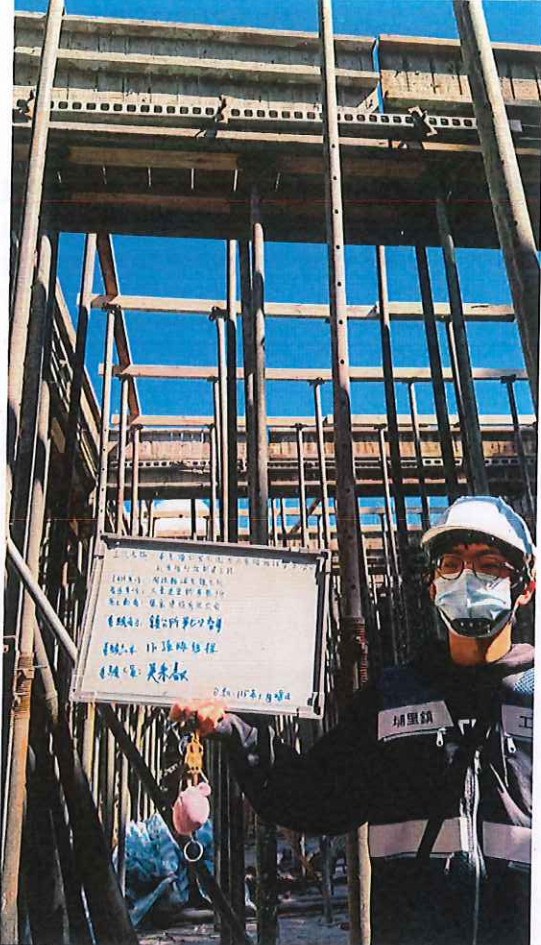
課長黃木良

機關首長

埔里鎮長廖志城(甲)

2/0

附件一

說明	1F 頂板模板組立
	
說明	空拍
	
